新亨镇硕联村村庄整治规划

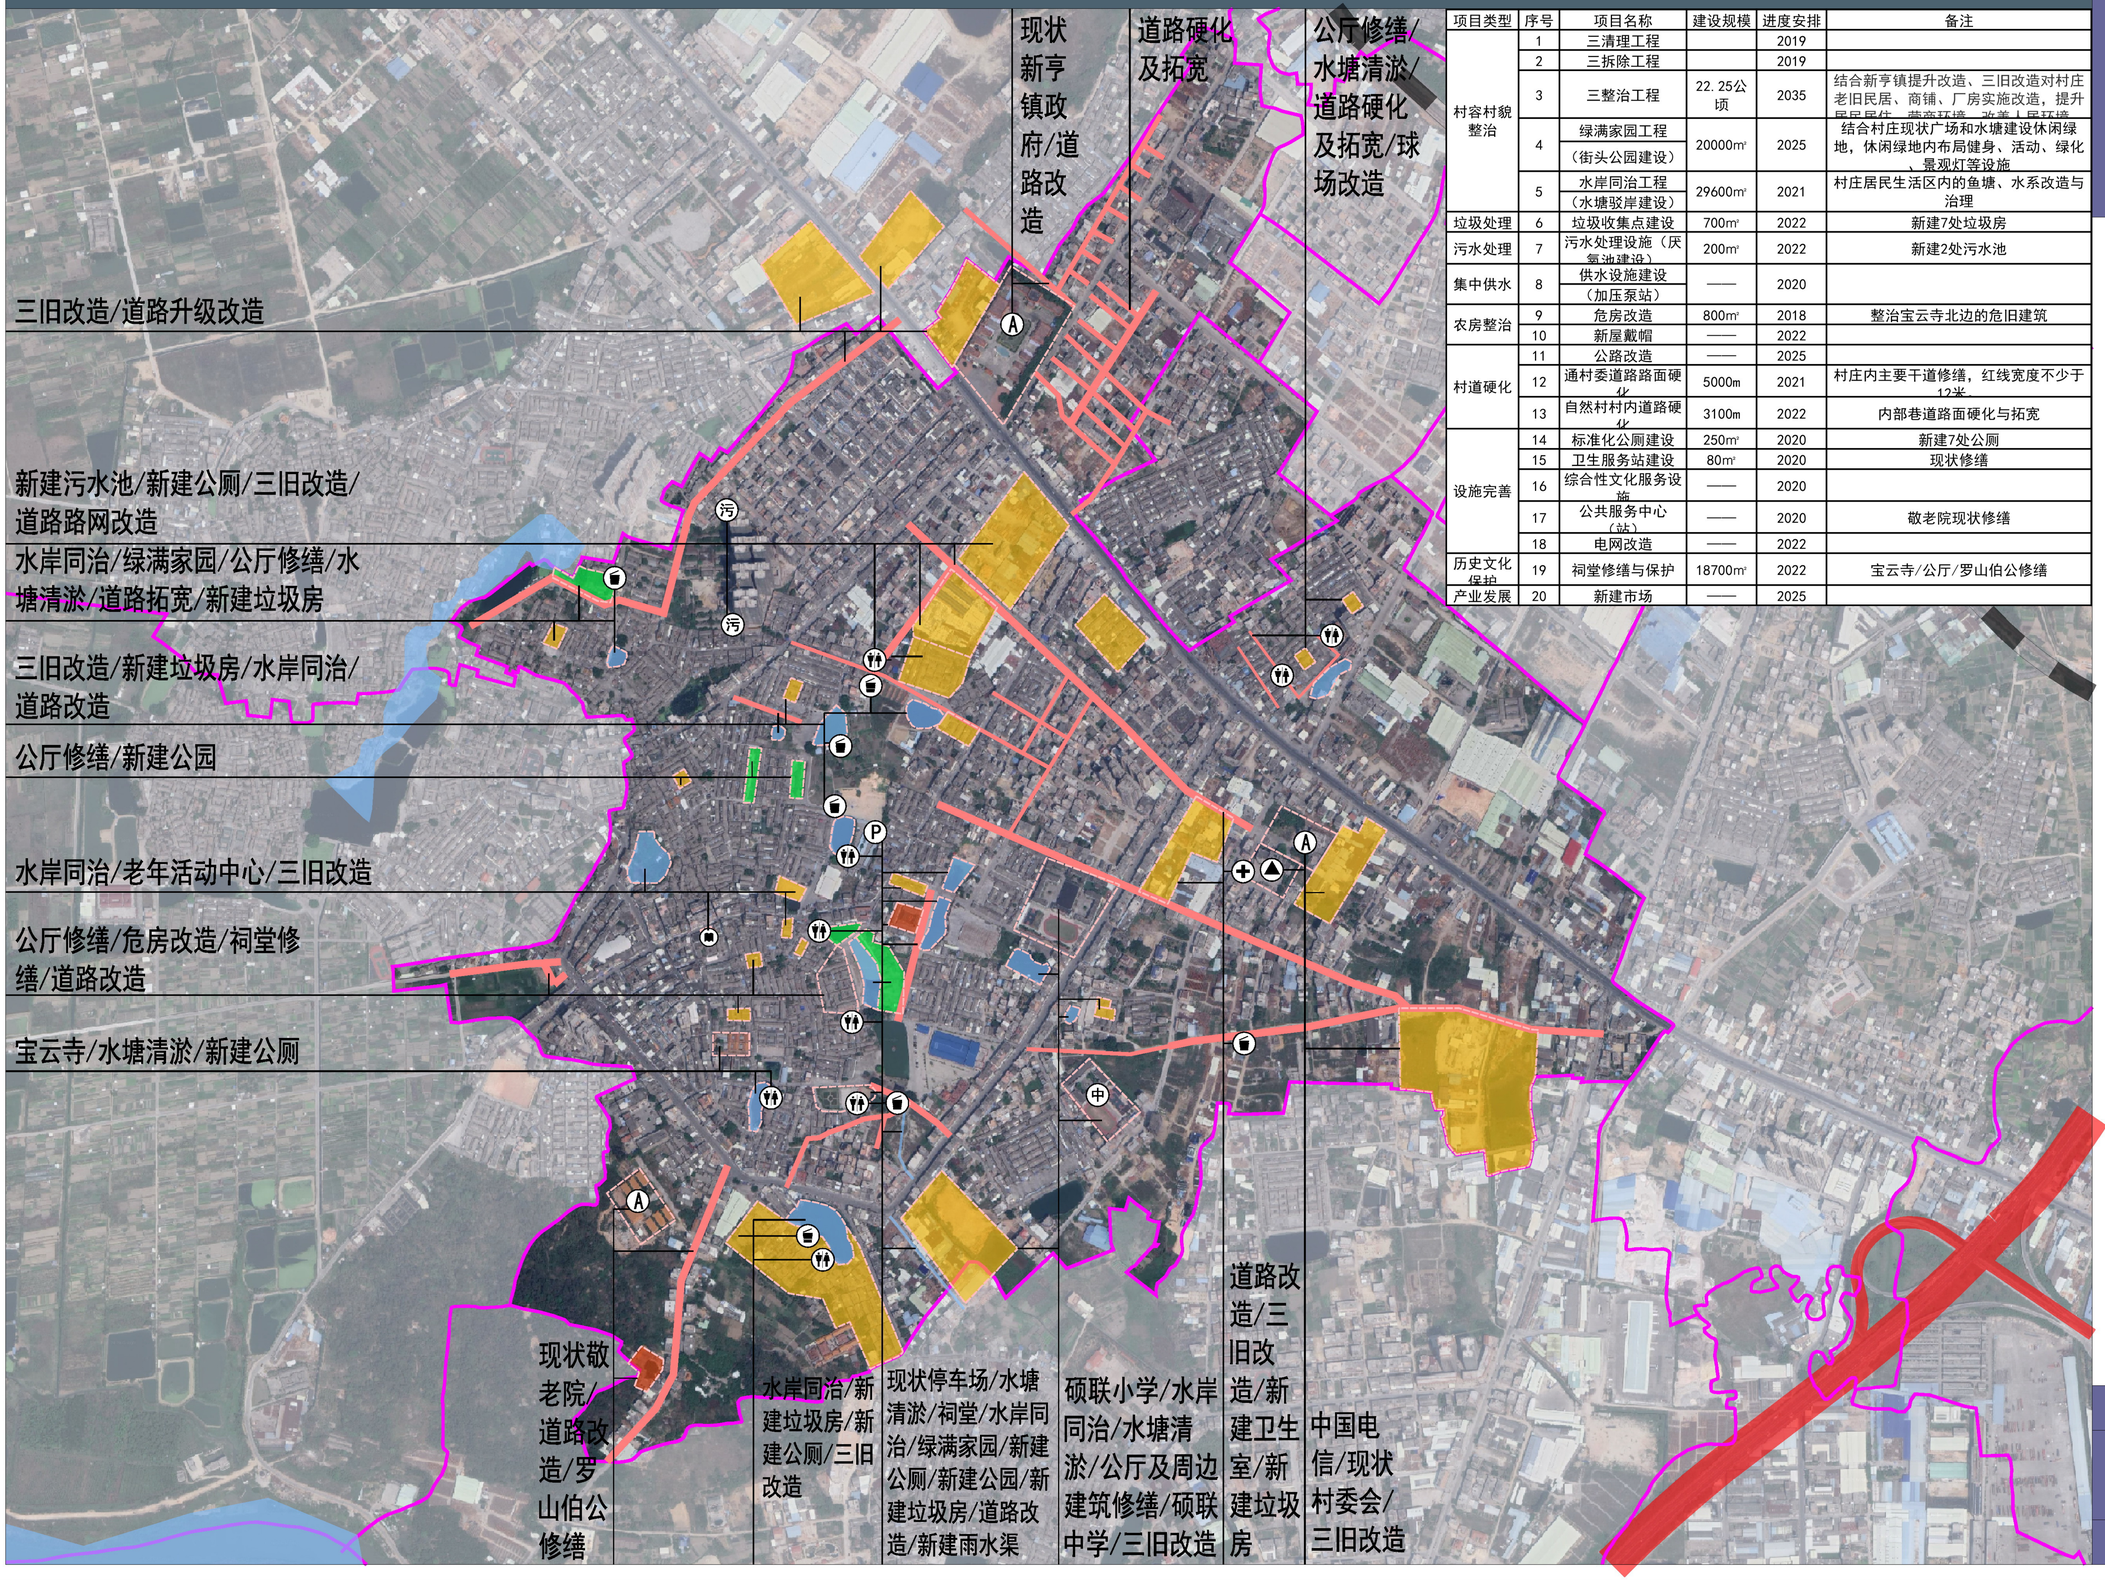

项目类型	序号	项目名称	建设规模	进度安排	备注
村容村貌整治	1	三清理工程		2019	
	2	三拆除工程		2019	
	3	三整治工程	22.25公顷	2035	结合新亨镇提升改造、三旧改造对村庄老旧民居、商铺、厂房实施改造，提升民居风貌、营商环境、改善人居环境
	4	绿满家园工程（街头公园建设）	20000㎡	2025	结合村庄现状广场和水塘建设休闲绿地，休闲绿地内布局健身、活动、绿化、景观灯等设施
	5	水岸同治工程（水塘驳岸建设）	29600㎡	2021	村庄居民生活区内的鱼塘、水系改造与治理
垃圾处理	6	垃圾收集点建设	700㎡	2022	新建7处垃圾房
污水处理	7	污水处理设施（厌氧池建设）	200㎡	2022	新建2处污水池
集中供水	8	供水设施建设（加压泵站）	——	2020	
农房整治	9	危房改造	800㎡	2018	整治宝云寺北边的危旧建筑
	10	新屋戴帽	——	2022	
村道硬化	11	公路改造	——	2025	
	12	通村委道路路面硬化	5000m	2021	村庄内主要干道修缮，红线宽度不少于12米
	13	自然村村内道路硬化	3100m	2022	内部巷道路面硬化与拓宽
设施完善	14	标准化公厕建设	250㎡	2020	新建7处公厕
	15	卫生服务站建设	80㎡	2020	现状修缮
	16	综合性文化服务设施	——	2020	
	17	公共服务中心（站）	——	2020	敬老院现状修缮
	18	电网改造	——	2022	
历史文化保护	19	祠堂修缮与保护	18700㎡	2022	宝云寺/公厅/罗山伯公修缮
产业发展	20	新建市场	——	2025	

0 100 200 400

图例

- 整治建筑
- 新增建筑
- 历史建筑
- 拆除建筑
- 绿地
- 水域
- 建设边界
- 行政村边界
- 现状道路
- 新建道路
- 公共服务中心/村委会
- 文化活动中心
- 幼儿园/小学/中学
- 公共公厕
- 垃圾收集点
- 卫生室
- 公园/广场
- 污水处理池
- 祠堂
- 庙宇
- 邻里中心
- 新村建设点
- 城市公用设施
- 城市公共管理设施
- 村庄产业

图名	村庄整治规划图
编制	新亨镇人民政府
单位	上海诺德建筑设计有限公司
图号	
